

週間工程表

工事名	奥平野低層配水本管整備工事その1					提出日	令和6年6月20日(木)			進捗率(6/20時点)	
工期	令和6年3月19日～令和7年3月31日					請負人	(株)西原組 木下			1.08%	
工種	月日	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
φ400・500取替撤去工事		no.16～			no.16～	no.16～	no.16～	no.16～	no.15～		
備考											


— : 実施
— : 完了



喫茶すわやま
割烹あさの

村
マツオカ

規制範囲 約 20 m

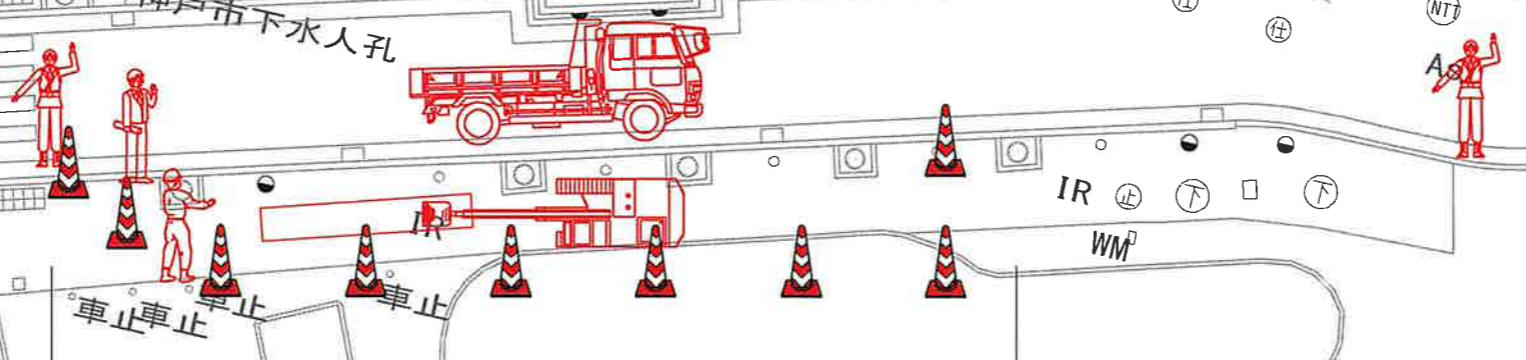

相樂園

こうべ小学校

こうべ小学校前～東側
関係車両以外通行止め

